

仮園舎の整備計画 に関する説明会

令和元年7月16日

次 第

日時：令和元年7月16日(火)
19時00分～

場所：亀有学び交流館
第一集会室


1. 仮園舎の配置について
2. 今後のスケジュール（予定）について
3. 質疑応答

仮園舎建設予定地周辺図



仮園舎建設予定地 葛飾区西亀有 1 - 18

配置図(案)

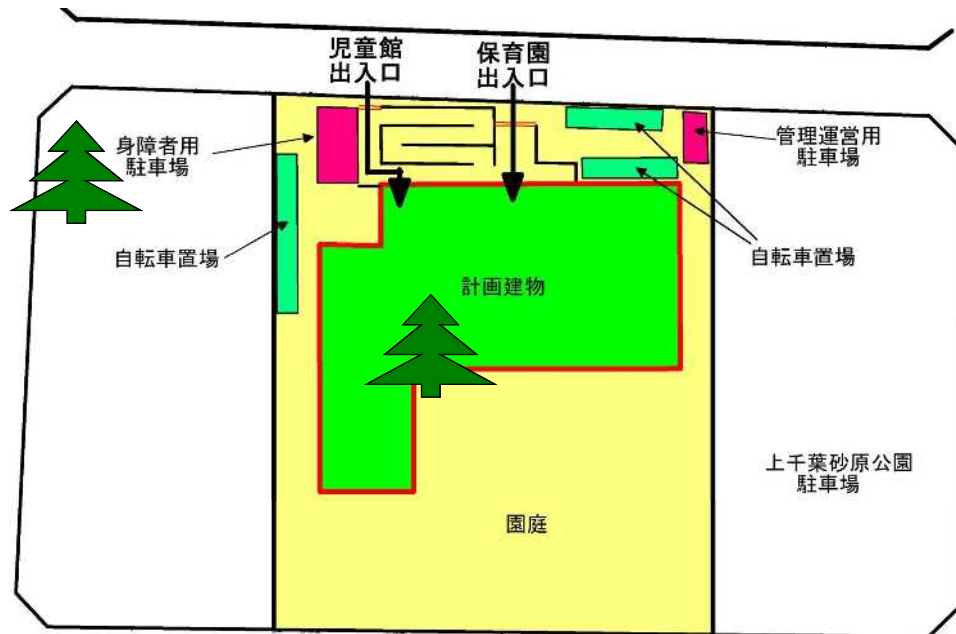

敷地面積 **1801.77^{m²}** 西亀有せせらぎ公園
 建築面積 **約620^{m²}**
 延床面積 **約1137^{m²}**

建物イメージ



3

建物イメージ



4

今後のスケジュール（予定）

仮園舎建設までのスケジュール

| 項目 | 月 | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | | | |
|--------------------|---|-------|---|-----|---|-------|----|----|---|----|----|--|
| | | 8月 | … | 12月 | … | … | 7月 | 8月 | … | 2月 | 3月 | |
| 地盤調査 | | | | | | | | | | | | |
| リース業者契約 | | | | | | | | | | | | |
| 詳細設計 各関係機関申請手続き | | | | | | | | | | | | |
| 工事説明会 | | | | | | | | | | | | |
| 仮園舎建設工事 | | | | | | | | | | | | |

5

今後のスケジュール（予定）

仮園舎利用のスケジュール

| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 西亀有保育園 【2021年3月～2023年3月】 | | 白鳥保育園・児童館 【2023年5月～2025年10月】 | | |
| | | | | 解体 11月 ～ 3月 |

6
